#### Gestió de Projectes Software: Conceptes Generals



©X. Franch, J. Pradel


#### Índex


- Cicle de vida (revisitat)
- Processos del cicle de vida
- Dades i informació dels projectes. Oficina de gestió de projectes

Gestió de Projectes Software (GPS)

UPC

2

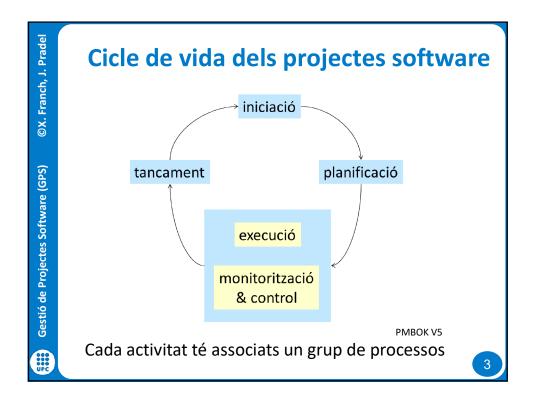

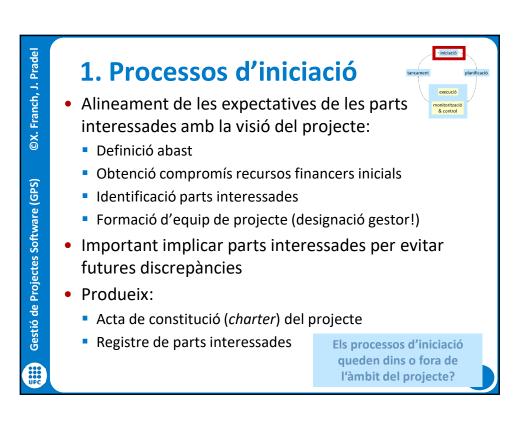

## Gestió de Projectes Software (GPS)

#### Processos d'iniciació



Acta de constitució del projecte (Charter)

- Document autorització formal existència projecte
- Dota al gestor del projecte de l'autoritat necessària
- Informació necessària:
  - Declaració de treball (statement of work, SoW) del projecte
    - · Descripció dels productes, serveis i resultats a produir
  - Cas de negoci
  - Acords
  - Factors d'entorn
    - Estàndards, regulacions, lleis, factors socials, condicions de mercat, ...
  - Possessions organitzacionals
    - Plantilles, processos, polítiques d'empresa, informació històrica-



#### SHEET CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPER


©X. Franch, J. Pradel

#### Processos d'iniciació



#### Identificació parts interessades

- Persones, grups o organitzacions que poden impactar o ser impactats per una decisió, activitat o resultat del projecte
  - Cal identificar-los i documentar interessos, implicació, interdependències, influència, ... → registre, evolutiu
  - Diverses classificacions, moltes vegades per parells de criteris, p.e.:



6



Gestió de Projectes Software (GPS)

Gestió de Projectes Software (GPS)

#### 2. Processos de planificació



 Traçar estratègia, tàctiques i camí per completar el projecte amb èxit. Cal:

- Refinament dels objectius
- Càlcul de l'esforç
- Elaboració d'un pla per aconseguir els objectius
- Processos altament iteratius, a mida que el projecte progressa
- Gestió clàssica vs gestió àgil: diferències

7

UPC

#### Processos de planificació



- Restriccions dels projectes:
  - Abast: Quants requisits o tasques s'han de fer
  - Temps o planificació: Quan durarà el projecte
  - Cost o recursos: Diners, persones, ...

El triangle de ferro/acer

Qualitat


Abast

- Per mantenir objectius de qualitat determinats, qualsevol modificació d'una de les tres variables implica modificar alguna de les altres dues
- Pot caler negociació


8


••• ••• ••• UPC


Gestió de Projectes Software (GPS)

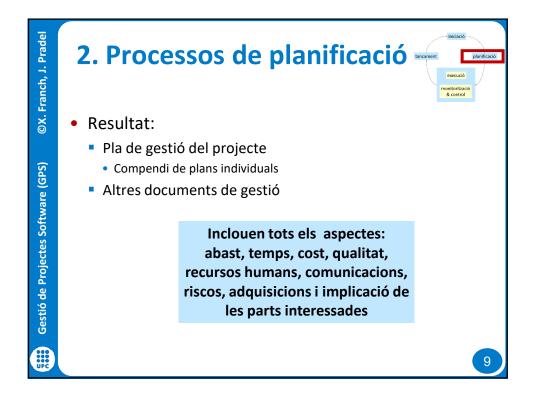





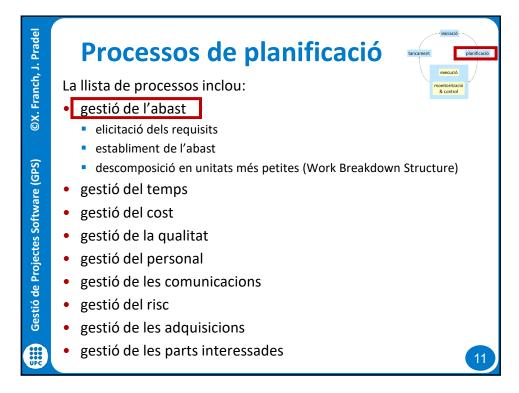


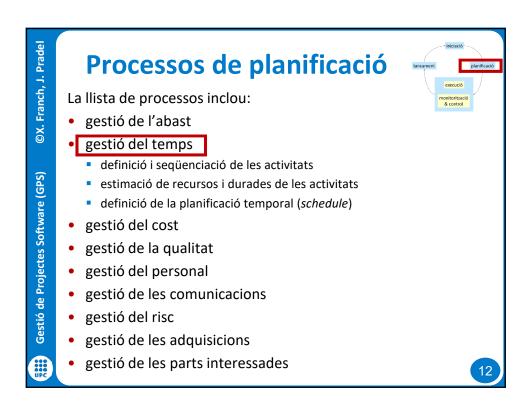


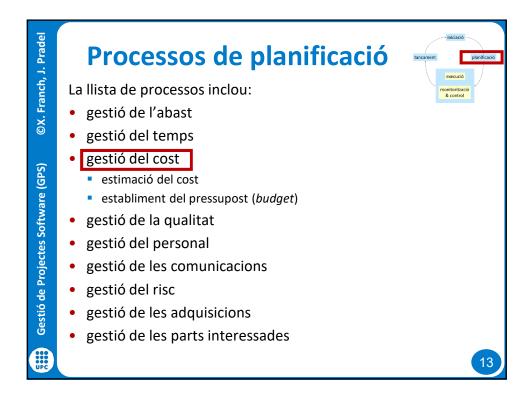


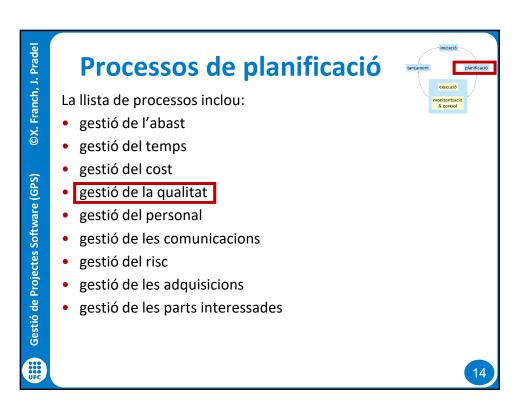

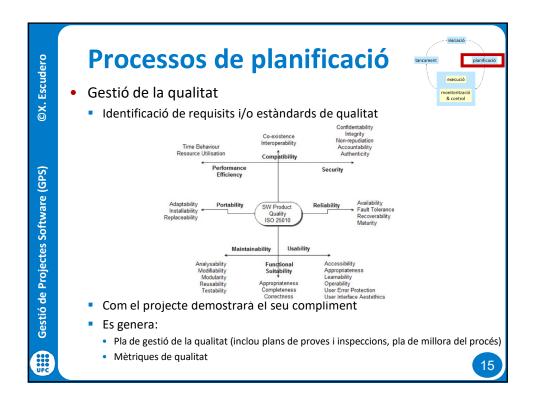

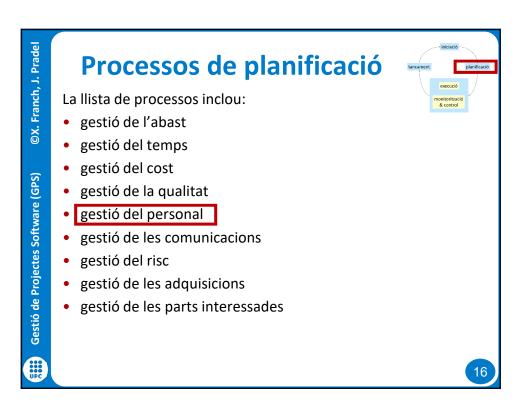



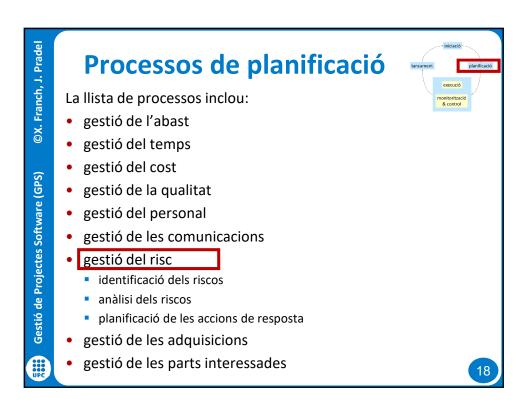

Processos de planificació

Gestió del risc

identificar riscos sobre funcionalitat oferta, qualitat, tecnologia, objectius de negoci, temps, pressupost...

analitzar i prioritzar els riscos en funció de:

impacte


probabilitat d'ocurrència

planificar accions → cal identificar diverses estratègies:

prevenció

mitigació

Aquesta anàlisi s'actualitza contínuament

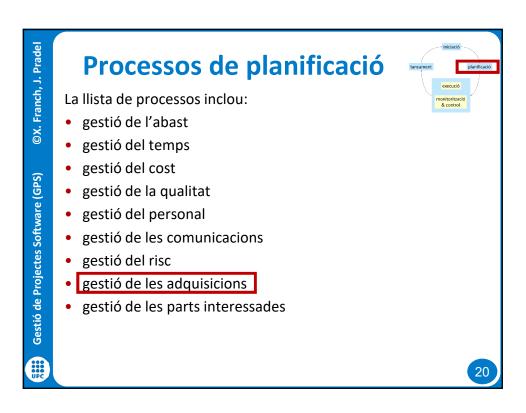


## Gestió de Projectes Software (GPS)

#### Processos de planificació

La llista de processos inclou:

- gestió de l'abast
- gestió del temps
- gestió del cost
- gestió de la qualitat
- gestió del personal
- gestió de les comunicacions
- gestió del risc
- gestió de les adquisicions
- gestió de les parts interessades



21


©X. Franch, J. Prade

## Gestió de Projectes Software (GPS)

#### 3. Processos d'execució



- Objectiu: Completar treball definit en el pla de gestió de projecte
  - Execució i integració de les activitats definides en el pla
  - Coordinació (i formació) de personal i altres recursos
  - Gestió de les expectatives de les parts interessades
- Necessiten adaptar-se als canvis (per natura iterativa processos planificació)
  - accions correctives
  - accions preventives
  - reparació de defectes
  - actualitzacions d'actius (assets) del projecte



Gestió de Projectes Software (GPS)

#### Processos d'execució

Gestió de l'equip (personal)



- El personal és una de les 4 Ps, per això cal:
  - Configurar-lo
    - Identificar, negociar dins organització, contractar externs, ...
    - Procés de selecció segons: disponibilitat, cost, experiència, habilitats, coneixement, actitud, empatia,...
  - Fer-lo créixer
    - Millorar-ne les competències i entorn de treball
    - Base: formació, bons canals de comunicació, estímuls,...
  - Gestionar-lo
    - Seguir rendiment, realimentar-lo (feedback), resoldre conflictes, gestionar canvis en l'equip, ...



©X. Franch, J. Prade

#### Gestió de la qualitat

Forma part dels processos d'execució (i també dels processos de monitorització & control)



- pla de gestió de la qualitat
- pla de millora del procés
- mètriques de qualitat
- mesures del control de la qualitat
- diversos documents del projecte

El resultat pot ser:

- peticions de canvis
- actualitzacions del pla de gestió del projecte, dels documents del projecte, dels actius de l'organització





Gestió de Projectes Software (GPS)

#### 4. Processos de monitorització i control



• Seguir i revisar progrés i rendiment projecte

- Comparació progrés amb previsions del pla de gestió
- Identificació i control dels canvis i recomanació d'accions correctives o preventives per evitar futurs problemes
- Produir informació de suport per a informes, prediccions, ...
- Es basen en una mesura i anàlisi continua del progrés i rendiment
  - A intervals regulars, quan certs esdeveniments es produeixen, o quan es donen condicions excepcionals
- Les dades recollides poden generar canvis en la planificació

25

#### UPC

©X. Franch, J. Prade

Gestió de Projectes Software (GPS)

**©X. Franch, J. Pradel** 

#### 5. Processos de tancament



• Objectius:

- Verificar formalment l'acabament del projecte
- Obtenció de l'aprovació per part del client
- Posta en producció dels productes i serveis
- Conducció de revisions i avaluacions post-mortem
- Actualització d'actius (assets) organitzacionals
- El tancament pot ser prematur per avortament

26



Gestió de Projectes Software (GPS)

#### Dades i informació del projecte

- Permanentment recollides:
  - Dades sobre rendiment del treball
    - P.ex. % treball completat, dates inici i final d'una activitat
  - Informació sobre rendiment del treball
    - P.ex. estat lliurables, estimacions d'acabament d'activitats
  - Informes sobre rendiment del treball
    - P.ex. recomanacions, informes periòdics per a la direcció
  - Peticions de canvi
  - Peticions d'actualitzacions del pla de gestió de projecte
  - ...



#### UPC

### ©X. Franch, J. Pradel

# Gestió de Projectes Software (GPS) ©X. Fra

#### L'oficina de gestió de projectes

- Estructura organitzativa que:
  - Estandarditza els processos de govern de projectes
  - Facilita compartició recursos, metodologies, eines i tècniques
  - Proveeix formació i mentoring
- Visió més àmplia que el gestor de projectes
- Diferents formes:
  - Suport: rol de consulta
  - Controladora: requereix cert tipus de conformitat
  - Directiva: controla totalment la gestió del projecte





Gestió de Projectes Software (GPS)

#### Referències

 A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK), 5th edition, 2013.

29

UPC

#### Gestió de Projectes Software: Conceptes Generals

